Sondre Langerud Moe	- Forstudie - Brukerhistorier - Pre-sprint - Sprint 1
Marcus Gundersen	- Testplan - Brukertesting - Sprintoppsummering
Christoffer Johansen	- UI-design - Utvikling av nettside - Sprintrapport

2 Prosjektplanlegging

2.1 Omfang

Vi har brukt en WBS for å dele inn alle hovedarbeidsoppgaver. En «Work Breakdown Structure (WBS)» er en hierarkisk struktur som gjør at vi kan dele hele prosjektet inn i mindre og mer håndterbare deler. Hensikten med en WBS er å kunne gjøre prosjektet mer håndterbart og enklere for oss som prosjekt team å følge prosjektet trinnvis.

I en WBS struktur finner man alle hovedoppgavene på den øverste linjen. Alle hovedoppgavene blir delt inn i mindre mer spesifikke oppgaver. Disse oppgavene må fullføres for å kunne bli ferdig med hovedoppgaven. Ved å bruke en WBS kan man enkelt inndele alle oppgavene.

Når det kommer til prosjektledelse så er WBS et kjempebra verktøy å kunne hjelpe prosjektledelsen med å oppnå oversikt. Dette hjelper ledelsen med å kunne planlegge og estimere tidsplaner, oppgaver og ressursbehov.

Vi har valgt å dele WBS opp på denne måten grunnet at det gir oss bedre oversikt, mye enklere å kunne fordele oppgaver, klar struktur, bedre kommunikasjon, tydelig ansvar, kontroll og overvåkning og kontinuerlig forbedring.

Under finner du WBS for prosjekt USNStart:

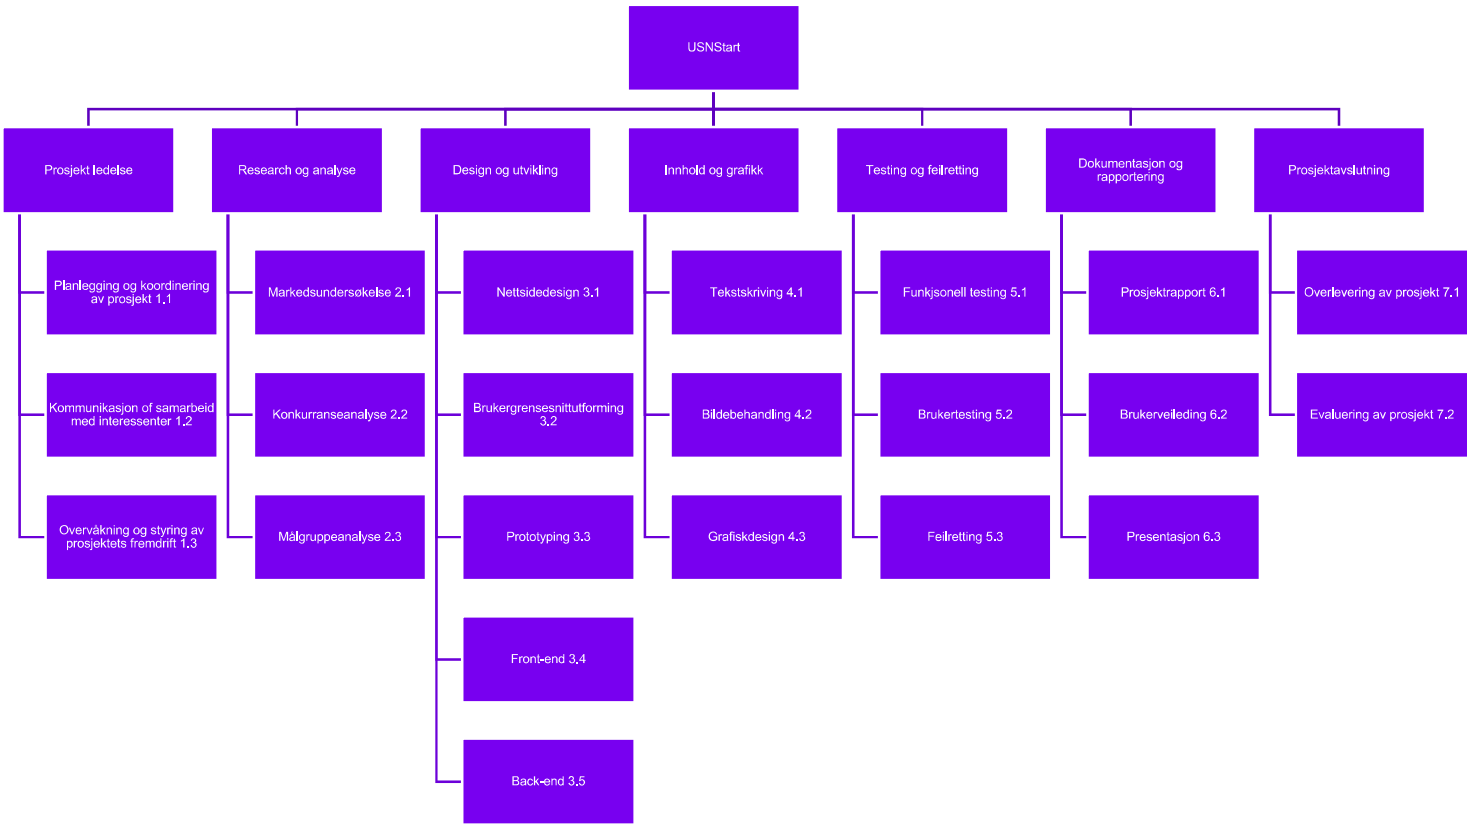

2.2 Tidsplanlegging

2.2.1 Sprint oversikt

Vi har valgt å bruke en agil metode, altså scrum. Dette hjelper oss med å finne tidsperioden vi må ha for å gjennomføre dette prosjektet. Siden vi bruker Scrum metoden så deler vi opp alle hovedoppgavene i ulike intervaller, eller det vi kaller for «sprinter» (sprint 1-7).

Vi var veldig usikre på hvor vi skulle starte med sprintene. Vi måtte først finne ut hva som måtte fullføres for å kunne lansere nettsiden. Deretter så var det å finne ut roller og hvor mye tid vi skulle bruke på hver sprint. I og med at vi har syv sprinter så vil det være veldig kritisk av vi klarer å dele opp sprintene med nok tid til å gjennomføre dem. Vi valgte å sette mest fokus på:

- Sprint 3 (Design og utvikling) - dette er grunnet til at vi vil ha en så enkel og brukervennlig nettside for kundene som mulig. Dette vil hjelpe med at kunder ikke blir overveldet eller forvirret av nettsiden. Jo mer intuitiv nettsiden, jo større sjans er det for at kundene vil komme tilbake til nettsiden igjen.
- Sprint 5 (Testing og feilretting) – Hvis vi skal kunne oppnå et tilfredsstillende system og nettside for kundene må vi også gjennomføre brukertester, systemtester og integrasjonstester.
- Sprint 6 (Dokumentasjon og rapportering) – Det er veldig viktig for oss at dokumentasjon og rapportering blir gjennomført på en riktig måte. Med god dokumentering og rapportering kan man se på fremdriften og avvikene i prosjektet.

Se vedlegg 1.

2.2.2 Gantt diagram

Et gantt diagram er også er kjempeviktig verktøy i prosjektledelse. Et gantt diagram kommer med mange fordeler som gjør at vi kan oppnå mer effektivisert planlegging, det blir letter å identifisere roller, overvåkning av prosjekt blir også relativt enklere.

Det som er så fint med et gantt diagram er at det er en visuell presentasjon av hva som kommer til å bli gjort. Det blir fort mye enklere for ledelsen å kunne forstå hva som skjer. I gantt diagrammet finner du alle hovedoppgavene våre som blir representer av en horisontal stolpe, lengden av stolpen viser varigheten av oppgaven. Lengden på stolpen viser også start og sluttdato. Rent visuelt så er det veldig enkelt å kunne få forståelse av prosjektet.

Under ser du gantt diagrammet vårt:

Aktivitet/Uke	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**
Prosjekt ledelse																	
Forskning og analyse																	
Design og utvikling																	
Innhold og grafikk																	
Testing og feilretting																	
Dokumentasjon og rapportering																	
Prosjektavslutning																	

Marcus Einarsen	Sondre Mogen	Rikke Larsen	Sondre Moe	Christoffer Johansen	Marcus Gundersen	Alle

Som man ser på diagrammet så er det veldig enkel og visuelt ryddig. Vi har valgt å dele gantt diagrammet på denne måten for å fremme effektivitet, ressursbehov, tidsfrister, behov og hvordan vi kan optimalisere prosjektet. Som igjen vil føre til en smidig og effektiv prosjektgjennomføring.

Vi har valgt denne inndeling grunnet likt kunnskapsnivå på alle i prosjektgruppen. Vi har valgt å ha «Design og utvikling» og «Dokumentasjon og rapportering» som felles

oppgaver dette er grunnet fordi at vi vil ha alle sammen med på «Design og utvikling» så vi kan utvikle den best brukervennlige nettside til USNStart. Og vi har satt «Dokumentasjon og rapportering» som felles, dette er gjort så vi kan ha bedre kontroll på dokumentasjonen og rapporteringen.

2.3 Kommunikasjon

Kommunikasjon er en av de viktigste midlene vi har for å kunne gjennomføre prosjektet. Det er viktig at vi avklarer roller, oppgaver, tidsplaner og prosjektets hovedmål. Ved kunne avklare dette så vil vi kunne minimere risikoer, forsinkelser, misforståelser og konflikter.

2.3.1 Roller

Under finner du en tabell med roller, ansvar og kommunikasjons muligheter. Vi bruker Facebook, Instagram og mobil for plattformer for verbal og skriftlig kommunikasjon. Github blir brukt som dokument lagring.

Tabell for roller og kommunikasjon:

Navn	**Roller**	**Kommunikasjon**
Marcus Einarsen	Prosjekt ansvarlig	Facebook, Instagram, GitHub, mobil, Zoom, Google meet
Marcus Gundersen	Analytiker, Grafiker	Facebook, Instagram, GitHub, mobil, Zoom, Google meet
Christoffer Johansen	Programmerer	Facebook, Instagram, Github, mobil, Zoom, Google meet
