1.7. Arbeidsfordeling

Gruppen består av fem medlemmer, mer info finner du i avsnitt 1.4.1

Abdinasir Ali Addow

- Interessenter
- Prosjekteamet
- Arbeidsfordeling
- Produktomfang
- Planlegging av tid

Bjarne Hovd Beruldsen

- Forstudie
- Scrum som metode (arbeidsmåte)
- WBS
- Gantt diagram
- Sprint oppsummering
- Backlog
- Koding av nettside

Laurent Zogaj

- Testing
- Prosjektomfang

Severin Waller Sørensen

- Abstrakt
- Prosjektbakgrunn og problemstilling
- Mål
- Ekskludering
- Risikoanalyse
- Kommunikasjon
- Arkitekturdesign
- Design av nettside (Figma)
- Prosjektevaluering

Ylli Ujkani

- Bidratt med diverse

2. Prosjektplanlegging

Prosjektplanlegging er en grunnleggende del av prosjektarbeid. Omfangsplanlegging blir delt i to deler prosjektomfang og produktomfang, dette regnes også som starten av prosjekt-planlegging og det er her prosjektets omfang og produktets omfang blir definert. Omfanget referer til all arbeidet gjort i henhold til opprettelse av produktet av prosjektet og alle prosessene forbundet med opprettelsen av produktet (Schwalbe, 2011, s. 178).

2.1. Prosjektomfang

Under prosjektets omfang har vi valgt å ta i bruk en aktivitets WBS (Work Breakdown Structure). WBS er en god måte å få oversikt over alt av prosesser som foregår under prosjektets omfang.

2.2. Produktomfang

Her har vi definert følgende produktomfang og våre forventninger til nettsiden.

- Produktet vårt er en nedside der man kan bestiller eller reserverer kontor i usn-coworking space
- Nettsiden skal være responsene og vil være tilgjengelig på mobilenheter, desktop og nettbrett.
- Nettsiden skal oppfylle alle brukerhistorier
- Det vil være mulig å endre språk til engelsk

Punkter som må bli gjennomført av prosjektteamet for å utvikle nettsiden

- Planlegge hvordan prosjektteamet skal gjennomføre prosjektet
- Samle inn kravene og behovene fra prosjekteieren
- Utvikle flere prototyper som er interaktive for å sikre at nettsiden skal fungere som forventet og at den er brukervennlig ved hjelp av verktøy som Figma.
- Sikre at nettsiden oppfyller alle krav.
- Designe layout som følger WCAG
- Fullføre kodingen av nettsiden
- Nettsiden skal bli testes før lansering

2.3. WBS

WBS er en hierarkisk oversikt over ulike aktiviteter og arbeid som skal bli gjennomført under prosjektets levetid. Det finnes mange ulike måter å utforme en WBS på. (Nguyen, Real-World Software Projects for Computer Science and Engineering Students, 2021, s. 27)

Vi har benyttet oss av en aktivitets WBS siden vi syntes den passet prosjektet vårt best. I starten av prosjektet satt vi inn de aktivitetene vi mente måtte til for å ende opp med et endelig produkt. Vår WBS endret vi etter milestone 1. Dette var grunnet bytting av arbeidsmetode fra Waterfall til Scrum. Det gjorde at vi måtte endre på aktivitetene i WBS 'en, siden vi måtte legge til sprintene vi skulle gjennomføre. Den ble derfor delt i 5 hovedkategorier/foreldreelementer og er av typen topp til bunn. Under disse hovedkategoriene finner man hva som skal utføres i de ulike delene. Til sammen skal disse aktivitetene føre til et ferdig produkt. Vår WBS har vært sentral for å kunne følge med på hvilke aktiviteter vi skulle gjennomføre og i hvilken rekkefølge. Den var også til stor hjelp når vi skulle opprette Gantt Diagrammet vårt.

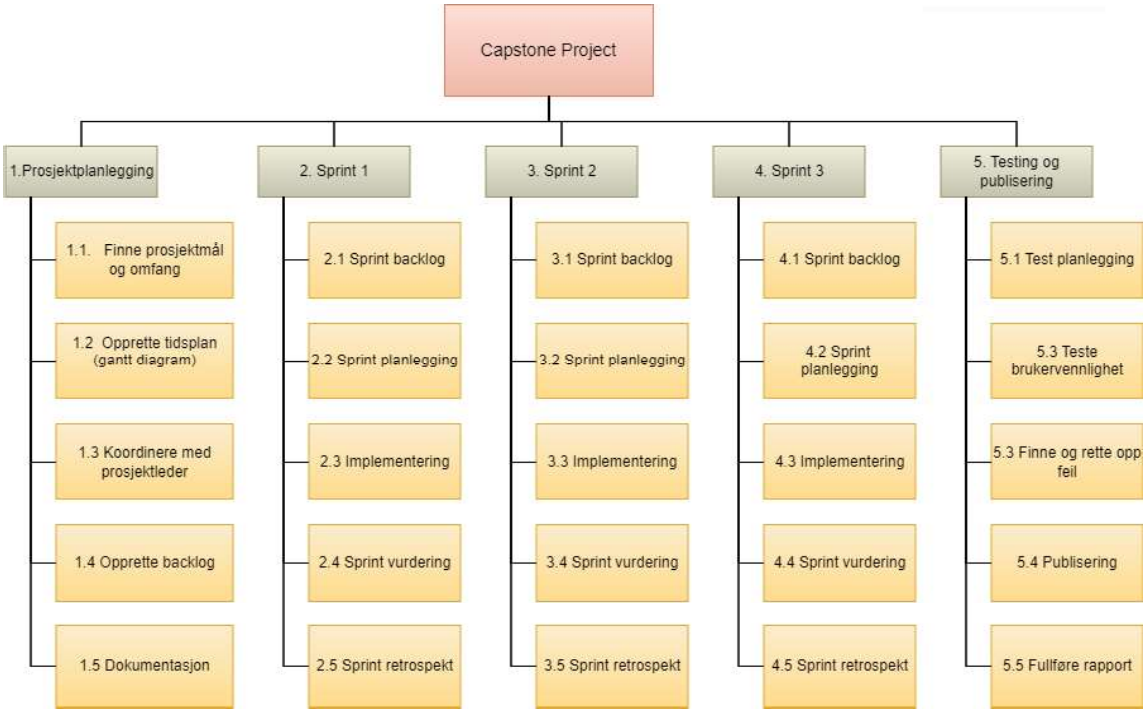

Figur 2.1: WBS

2.4. Planlegging av tid

Nedenfor kan man se en tabell som gir oversikt de ulike fasene og hvor mye tid som blir brukt på dem. Tabellen er bare for å gi oversikt, mer detaljer om hva som blir gjort finner man i sprintoppsummeringene fra punkt 8.1 til 8.5.

Fase	Periode	Aktivitet
Prosjektplanlegging	Januar 2024	Vi skal planlegge hvordan prosjektet skal utføres og Samle inn krav og behov fra prosjekteieren.
Design	Januar-februar 2024	Utvikle ulike prototyper som er interaktive og designe den visuelle appellen.
Utvikling	Februar-Mars 2024	Utvikling av nettsiden og integrere de ulike funksjonalitetene som bookingsystemer osv.
Testing	April 2024	Her skal vi utføre ulike tester får å teste at nettsiden funker som forventet.
Lansering	April 2024	Gjennomgang av nettsiden basert på testresultater og publisering av den.
Etterkant	April 2024	Forbedre nettsiden etter tilbakemeldinger fra brukere.

Tabell 2.1: Planlegging av tid

2.5. Gantt Diagram

Når det gjelder tidsplanlegging er gantt diagrammet en viktig del. Den beskriver og illustrerer prosjektets tidsplan. Dette gjøres ved hjelp av grafer som går både vertikalt og horisontalt. Gantt diagrammet bør ikke tegnes, men lages ved hjelp av en mal. Den bør heller ikke inneholde for mange detaljer. (Nguyen, Real-World Software Projects for Computer Science and Engineering Students, 2021, ss. 29-30). Gantt diagrammet har hjulpet oss med å se en mer detaljert versjon av vår WBS. Til oppretting av vår Gantt diagram har vi brukt malen som var vedlagt under
